

市立桜台・光明こども園の工事が進んでいます！

25
PERCENT
工事進捗


令和9年4月開園に向け、桜台保育所の大規模改修工事が本格的に進行中です！慣れない環境の中、みなさまのご協力に感謝いたします。工事完了部分と、園児の生活の様子をお届けします。

工事進捗状況

- ☒ 仮設園舎の建設
- ☐ 3～5歳児保育室の改修
- ☒ 0～2歳児保育室の改修
- ☐ 幼児用トイレの改修
- ☒ 乳児用トイレの改修
- ☐ 職員室の改修
- ☐ エレベーターの新設
- ☐ 厨房の全面リニューアル
- ☐ 園庭遊具の新設、植栽



▲ 仮設園舎 / ▼ 仮設園舎にお引越し

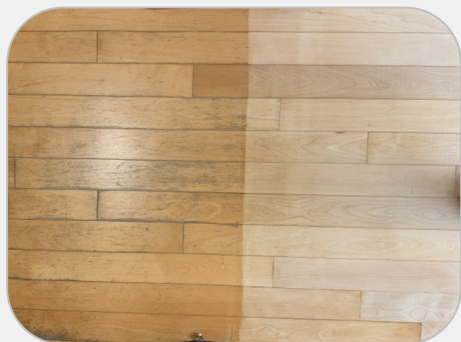

▲ 床材ビフォーアフター（右が研磨後）



▲ 改修後の保育室／廊下／乳児用トイレ ぴかぴかになりました♪



市立春木・大芝こども園の今 ～ 園児の笑顔と外構整備 ～

75
PERCENT
工事進捗

開園から3か月が経ち、園児たちはすっかり新しい環境に慣れ、毎日元気いっぱいに過ごしています。

外構工事では、旧春木幼稚園園舎の解体工事が完了しました！



▲ 旧春木幼稚園跡地

（仮称）民間大宮認定こども園 地域説明会を開催しました

令和10年4月開園予定の（仮称）民間大宮こども園について、地域住民の皆様、市立大宮保育所・大宮幼稚園の保護者の皆様に向けた説明会を6月に実施しました。いただいたご意見は今後の運営に反映してまいります。

定員計画（予定）

年齢	認定	1号認定（教育）	2号認定（保育）	3号認定（保育）	小計
0歳児	—	—	—	6	6
1歳児	—	—	—	10	10
2歳児	—	—	—	12	12
3歳児	15	17	—	—	32
4歳児	15	17	—	—	32
5歳児	15	17	—	—	32
合計	45	51	28	—	120

開園までのタイムライン

- R8.2 事業者決定
- R8.3 基本協定締結
- R8.7 現在 NOW
- R8.10 開発事前協議／実施設計
- R9.1 土地売買契約
- R9.2 工事着工
- R10.3 竣工
- R10.4 開園



説明会でいただいた主なご質問・ご意見

保育内容・教育方針

- Q. 民営化後も現在の保育内容は継続されますか。
- A. 現在の公立園の保育内容を出来る限り引き継ぎます。こども主体の保育や自然・異年齢交流を大切にし、現時点で外部講師による有料プログラム等を導入する予定はありません。

職員体制・引継ぎ

- Q. 新園への職員や保育内容の引継ぎはどのように行われますか。
- A. 市立園職員は他の公立園等へ異動になりますが、開園前から十分な引継ぎを行い、保育内容や子ども・保護者との関係を丁寧に引き継ぎます。

地域との関わり

- Q. 民営化後も園と地域とのつながりは維持されますか。
- A. 地域のご意見を十分にお聞きしながら事業を進め、開園後も地域に根付けるような園運営に努めます。

保育環境・施設運営

- Q. 定員増加によって保育環境は変わりませんか。
- A. 園児数に応じて柔軟に運営し、保育室等を活用しながら、障害児保育や医療的対応も継続し、安心して過ごせる環境を整備します。

送迎・交通安全対策

- Q. 送迎や交通安全対策はどのように進めますか。
- A. 道路管理者や警察と協議しながら、安全な車両動線や交通対策を検討しています。なお、工事期間中の大宮保育所の送迎駐車場は、隣接する児童遊園内に仮設駐車場を整備します。
